

Buchungsblatt Kostenartengruppen

Jahr: 2006

Monat: September

lfd-Nr.	Bezeichnung	Datum	Beleg	Soll	Haben	Kostenart	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenart	Bezeichnung Kostenstelle
001	Besitzges./Mietkosten September	18. Aug 06	RE 6/020	2000,00		17	9400	Bezugskosten AGK	Verwaltung
002	Besitzges./Überlassung Student Sep06	29. Dez 06	RE 6/022	400,00		17	9400	Bezugskosten AGK	Verwaltung
003	Besitzges./Miete Betr.mittel Sep	29. Dez 06	RE 6/022	300,00		17	9400	Bezugskosten AGK	Verwaltung
004	kalk. Abschr. Laserdrucker 1/12	30. Sep 06	2642079	19,32		13	9400	Bürokosten	Verwaltung
005	Kurbelgerüstböcke	15. Sep 06	150209	730,00	699,60	19	9400	Sonstige Ko.	Verwaltung
006	Schrank	19. Sep 06	32948	85,34		13	9400	Bürokosten	Verwaltung
007	Raumkosten	28. Feb 06		94,00		12	9400	Grundstücks- und Geb	Verwaltung
008	Beitrag Untern.verband	1. Sep 06	3334	93,25		19	9400	Sonstige Ko.	Verwaltung
009	Kfz-Kosten	31.09.2006		648,85		14	9400	Kfz-Kosten	Verwaltung
010	Buchführung/Lohnrechnungskosten	14. Sep 06		125,30		15	9400	Dienstleistungen, Vers	Verwaltung
011	Werkzeuge und Kleingeräte	27. Sep 06		113,42		09		Kleingeräte/Werkzeug	
012	Nebenkosten des Geldverkehrs	30. Sep 06		44,80		19	9400	Sonstige Ko.	Verwaltung
013	Bürokosten	28. Sep 06		172,45		13	9400	Bürokosten	Verwaltung
014	Telefon	15. Sep 06		50,60		13	9400	Bürokosten	Verwaltung
015									
016	Bst Albus Material Sep	30. Sep 06		3073,10		04	9524	Baustoffe	PRO6/168: Neubau EFH Engelsdorf Albus
017	Bst Albus Lohn Sep 225 h	30. Sep 06		2205,00		01	9524	Löhne & Gehälter A/P	PRO6/168: Neubau EFH Engelsdorf Albus
018	lohngebunden Ko Dezember	30. Sep 06		2830,38		02		Sozialkosten A/P (Uml	
019									
020	Bst Berger Material	30. Sep 06		963,79		04	9523	Baustoffe	PROS/200: Fassade Straßenseite Berger
021	Bst Berger Lohn 94 h	30. Sep 06		921,20		01	9523	Löhne & Gehälter A/P	PROS/200: Fassade Straßenseite Berger
022	Bst Berger Fremdst. Klempner	30. Sep 06		532,00		10	9523	Fremdleistungen	PROS/200: Fassade Straßenseite Berger
023									
024	Bst Hempel/Material	30. Sep 08		575,23		04	9528	Baustoffe	PRO6/177: Körnitz, Fassade und Hofpflaster Hen
025	Bst Hempel/Lohn 39h	30. Sep 08		343,00		01	9528	Löhne & Gehälter A/P	PRO6/177: Körnitz, Fassade und Hofpflaster Hen
026	Bst Hempel/Fremdleihe Bagger	30. Sep 08		137,26		06	9528	Gerätekosten	PRO6/177: Körnitz, Fassade und Hofpflaster Hen
027									
028	Gefha/Baustellenmaterial	30. Sep 06		1581,47		04	9522	Baustoffe	PRO6/174: Treppendemontage und -verschluß C
029	Gefha/Treppenaue/Lohn 35h	30. Sep 06		343,00		01	9522	Löhne & Gehälter A/P	PRO6/174: Treppendemontage und -verschluß C
030									
031	Felix/ Baumaterial	30. Sep 06		357,20		04	9520	Baustoffe	PRO6/173: Innentüreineinbau Felix
032	Felix/Innentüren Lohn 9h	30. Sep 06		88,20		01	9520	Löhne & Gehälter A/P	PRO6/173: Innentüreineinbau Felix
033									
034									
035									
036									
037									

Verwaltungskosten Salden

Kostenartengruppe: Verwaltungskosten (Zusammenfassung Kostenart 12-19)

Monat	Soll bisher	Haben bisher	Saldo bisher	Soll Monat	Haben Monat	Saldo Monat	Soll Stichtag	Haben Stichtag	Saldo Stichtag
Januar	0,00	0,00	0,00	2.322,15	0,00	2.322,15	2.322,15	0,00	2.322,15
Februar	2.322,15	0,00	2.322,15	3.358,14	0,00	3.358,14	5.680,29	0,00	5.680,29
März	5.680,29	0,00	5.680,29	2.392,84	0,00	2.392,84	8.073,13	0,00	8.073,13
April	8.073,13	0,00	8.073,13	3.921,09	1.110,00	2.811,09	11.994,22	1.110,00	10.884,22
Mai	11.994,22	1.110,00	10.884,22	4.191,64	0,00	4.191,64	16.185,86	1.110,00	15.075,86
Juni	16.185,86	1.110,00	15.075,86	3.914,23	0,00	3.914,23	20.100,09	1.110,00	18.990,09
Juli	20.100,09	1.110,00	18.990,09	5.393,72	211,86	5.181,86	25.493,81	1.321,86	24.171,95
August	25.493,81	1.321,86	24.171,95	5.337,48	1.608,00	3.729,48	30.831,29	2.929,86	27.901,43
September	30.831,29	2.929,86	27.901,43	4.763,91	699,60	4.064,31	35.595,20	3.629,46	31.965,74
Oktober	35.595,20	3.629,46	31.965,74	4.779,96	0,00	4.779,96	40.375,16	3.629,46	36.745,70
November	40.375,16	3.629,46	36.745,70	3.882,84	0,00	3.882,84	44.258,00	3.629,46	40.628,54
Dezember	44.258,00	3.629,46	40.628,54	6.691,67	227,33	6.464,34	50.949,67	3.856,79	47.092,88
Gesamt				50.949,67	3.856,79	47.092,88			

Herstellkosten Salden

Kostenartengruppe: Herstellkosten (Zusammenfassung Kostenart 01-11 und 20-21)

Monat	Soll bisher	Haben bisher	Saldo bisher	Soll Monat	Haben Monat	Saldo Monat	Soll Stichtag	Haben Stichtag	Saldo Stichtag
Januar	0,00	0,00	0,00	3.112,75	0,00	3.112,75	3.112,75	0,00	3.112,75
Februar	3.112,75	0,00	3.112,75	1.597,26	0,00	1.597,26	4.710,01	0,00	4.710,01
März	4.710,01	0,00	4.710,01	7.067,39	1.500,00	5.567,39	11.777,40	1.500,00	10.277,40
April	11.777,40	1.500,00	10.277,40	16.873,07	0,00	16.873,07	28.650,47	1.500,00	27.150,47
Mai	28.650,47	1.500,00	27.150,47	26.761,77	0,00	26.761,77	55.412,24	1.500,00	53.912,24
Juni	55.412,24	1.500,00	53.912,24	30.056,22	0,00	30.056,22	85.468,46	1.500,00	83.968,46
Juli	85.468,46	1.500,00	83.968,46	23.840,33	0,00	23.840,33	109.308,79	1.500,00	107.808,79
August	109.308,79	1.500,00	107.808,79	15.420,60	0,00	15.420,60	124.729,39	1.500,00	123.229,39
September	124.729,39	1.500,00	123.229,39	14.064,25	0,00	14.064,25	138.793,64	1.500,00	137.293,64
Oktober	138.793,64	1.500,00	137.293,64	12.789,00	0,00	12.789,00	151.582,64	1.500,00	150.082,64
November	151.582,64	1.500,00	150.082,64	11.881,87	0,00	11.881,87	163.464,51	1.500,00	161.964,51
Dezember	163.464,51	1.500,00	161.964,51	14.879,58	0,00	14.879,58	178.344,09	1.500,00	176.844,09
Gesamt				178.344,09	1.500,00	176.844,09			

Umlagesätze I Monatswerte

Kostenarten: Verwaltungskosten, Sozialkosten A/P, Kleingeräte/Werkzeuge

Monat	Saldo Verwaltungs- kosten	Saldo Herstellkosten	Umlagesatz I Verwaltungs- kosten	Saldo Sozialkosten A/P Koag 02	Saldo Löhne A/P Koag 01	Umlagesatz I Sozialkosten A/P	Saldo Kleinger./Werkz Koag 09	Saldo Löhne A/P Koag 01	Umlagesatz I Kleinger./Werkz.
Januar	2322,15	3112,75	74,60%	529,20	661,00	80,06%	47,25	661,00	7,15%
Februar	3358,14	1597,26	210,24%	403,34	514,00	78,47%	9,72	514,00	1,89%
März	2392,84	5567,39	42,98%	1220,64	1685,60	72,42%	39,18	1685,60	2,32%
April	2811,09	16873,07	16,66%	3882,88	4821,63	80,53%	30,54	4821,63	0,63%
Mai	4191,64	26761,77	15,66%	5667,76	6895,77	82,19%	54,49	6895,77	0,79%
Juni	3914,23	30056,22	13,02%	6440,00	8050,70	79,99%	101,50	8050,70	1,26%
Juli	5181,86	23840,33	21,74%	5463,12	7026,60	77,75%	145,43	7026,60	2,07%
August	3729,48	15420,60	24,19%	2748,47	3435,88	79,99%	50,00	3435,88	1,46%
September	4064,31	14064,25	28,90%	2830,38	3900,40	72,57%	113,42	3900,40	2,91%
Oktober	4779,96	12789,00	37,38%	3355,24	4194,04	80,00%	75,18	4194,04	1,79%
November	3882,84	11881,87	32,68%	3078,37	3900,40	78,92%	178,57	3900,40	4,58%
Dezember	6464,34	14879,58	43,44%	3508,25	4682,58	74,92%	206,67	4682,58	4,41%
Gesamt	47092,88	176844,09	26,63%	39127,65	49768,60	78,62%	1051,95	49768,60	2,11%

Umlage Verwaltungskosten: $\frac{\text{Verwaltungs-kosten}}{\text{Herstellkosten}} * 100$

Umlage Sozialkosten: $\frac{\text{Sozialkosten}^{AP}}{\text{Löhne}^{AP}} * 100$

Umlage Kleingeräte/Werkzeuge: $\frac{\text{Kleingeräte/Werkzeuge}}{\text{Löhne}^{AP}} * 100$

Anlage 4: Saldenliste Zuschlagsätze

Umlagesätze II Stichtagswerte

Kostenarten: Verwaltungskosten, Sozialkosten A/P, Kleingeräte/Werkzeuge

Monat	Saldo Verwaltungs- kosten	Saldo Herstellkosten	Umlagesatz II Verwaltungs- kosten	Saldo Sozialkosten A/P Koag 02	Saldo Löhne A/P Koag 01	Umlagesatz II Sozialkosten A/P	Saldo Kleinger./Werkz Koag 09	Saldo Löhne A/P Koag 01	Umlagesatz II Kleinger./Werkz.
Januar	2322,15	3112,75	74,60%	529,20	661,00	80,06%	47,25	661,00	7,15%
Februar	5680,29	4710,01	120,60%	932,54	1175,00	79,37%	56,97	1175,00	4,85%
März	8073,13	10277,40	78,55%	2153,18	2860,60	75,27%	96,15	2860,60	3,36%
April	10884,22	27150,47	40,09%	6036,06	7682,23	78,57%	126,69	7682,23	1,65%
Mai	15075,86	53912,24	27,96%	11703,82	14578,00	80,28%	181,18	14578,00	1,24%
Juni	18990,09	83968,46	22,62%	18143,82	22628,70	80,18%	282,68	22628,70	1,25%
Juli	24171,95	107808,79	22,42%	23606,94	29655,30	79,60%	428,11	29655,30	1,44%
August	27901,43	123229,39	22,64%	26355,41	33091,18	79,64%	478,11	33091,18	1,44%
September	31965,74	137293,64	23,28%	29185,79	36991,58	78,90%	591,53	36991,58	1,60%
Oktober	36745,70	150082,64	24,48%	32541,03	41185,62	79,01%	666,71	41185,62	1,62%
November	40628,54	161964,51	25,08%	35619,40	45086,02	79,00%	845,28	45086,02	1,87%
Dezember	47092,88	176844,09	26,63%	39127,65	49768,60	78,62%	1051,95	49768,60	2,11%
Gesamt	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Umlage Verwaltungskosten: $\frac{\text{Verwaltungs-kosten}}{\text{Herstellkosten}} * 100$

Umlage Sozialkosten: $\frac{\text{Sozialkosten}^{AP}}{\text{Löhne}^{AP}} * 100$

Umlage Kleingeräte/Werkzeuge: $\frac{\text{Kleingeräte/Werkzeuge}}{\text{Löhne}^{AP}} * 100$

Anlage 4: Saldenliste Zuschlagsätze

Kostenstelle Verwaltung

Nr. 9400
Monat Dezember

Ko.arten- gruppe	lfd. Monat	Jahresbeginn bis Monat
12 Grundstücks- und Gebäudekosten	94,00	2.203,55
13 Bürokosten	583,82	1.949,06
14 Kfz-Kosten	593,54	7.717,38
15 Dienstleistungen, Versicherungen	2.948,45	5.835,24
16 Reparaturen/Instandhaltung	213,54	2.558,49
17 Bezugskosten AGK	1.610,00	24.850,00
18 Personalkosten T/K	0,00	0,00
19 Sonstige Ko.	420,99	1.979,16
Gesamtkosten	6.464,34	47.092,88
Umlagen	-6.464,34	-47.092,88
Ergebnis	0,00	0,00

Umlage
Verwaltungs-
kosten: $\frac{\text{Verwaltungskosten}}{\text{Herstellkosten}} * 100$

Verwaltungskosten Monat: 6464,34
Herstellkosten Monat: 14879,58

Umlage Verwaltungskosten Monat: 43,44%

Verwaltungskosten Stichtag: 46792,88
Herstellkosten Stichtag: 176844,09

Umlage Verwaltungskosten Stichtag: 26,46%

Monatswerte Einzelbaustelle


Baustelle: Hetze: Neubau Eigenheim
 Baubeginn: 09.01.06
 Bauende: 28.08.06

KoSt-Nr.: 9501
 Projekt-Nr.: PRO5/125
 Bauleistung: 97.025,1 €

lfd.-Nr.: 2

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bauleistung	4.795,00	1.918,00	6.712,00	14.384,00	19.178,00	19.354,08	26.849,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleist.	4.795,00	1.918,00	6.712,00	14.384,00	19.178,00	19.354,08	26.849,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellkost	3.112,75	1.597,26	5.567,39	10.417,24	15.591,04	14.201,50	20.393,89	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ant. Verw.ko	2.322,15	3.358,14	2.392,84	1.735,53	2.441,99	1.849,47	4.432,75	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Selbstkosten	5.434,90	4.955,40	7.960,23	12.152,78	18.033,04	16.050,97	24.826,65	3.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-639,90	-3.037,40	-1.248,23	2.231,22	1.144,96	3.303,11	2.022,35	601,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Monatswerte Einzelbaustelle

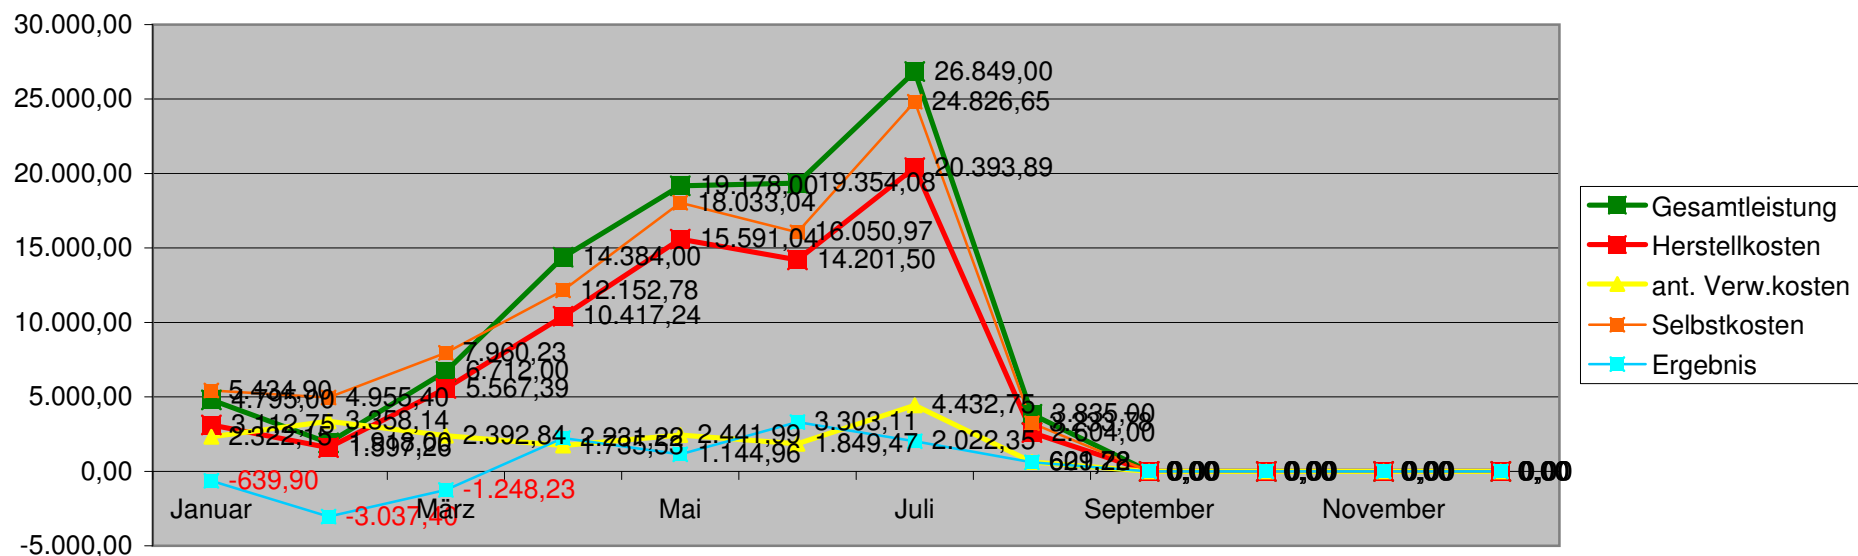

Erfogsstruktur Einzelbaustelle Monatswerte

Baustelle: Hetze: Neubau Eigenheim
 Baubeginn: 09.01.06
 Bauende: 28.08.06

KoSt-Nr.: 9501
 Projekt-Nr.: PRO5/125
 Bauleistung: 97.025,1 €

lfd.-Nr.: 2

	Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	%
01	Lohnko. A/P	661,00	514,00	1.685,60	2.263,83	3.999,87	3.483,90	5.997,60	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,60	20,73%
02	Soz.ko. A/P	529,20	403,34	1.220,64	1.823,07	3.287,57	2.786,88	4.663,08	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,98	16,40%
03	LNK A/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04	Baustoffe	1.005,30	670,20	630,00	3.480,00	7.412,00	6.406,80	7.533,08	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.142,68	30,38%
05	Hilfs-/Betriebl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Gerätekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07	Baustellena	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,07%
08	Rüst-, Schal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	Kg./Werkz. (	47,25	9,72	39,18	14,34	31,61	43,92	124,13	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,34%
10	Fremdleistun	870,00	0,00	1.926,97	2.836,00	860,00	1.480,00	2.076,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,97	11,40%
11	Allgem. Kost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Bestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
=	Herstellkosten	3.112,75	1.597,26	5.567,39	10.417,24	15.591,04	14.201,50	20.393,89	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.485,08	79,32%
+	Verw.ko (Um	2.322,15	3.358,14	2.392,84	1.735,53	2.441,99	1.849,47	4.432,75	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,65	20,68%
=	Selbstkosten	5.434,90	4.955,40	7.960,23	12.152,78	18.033,04	16.050,97	24.826,65	3.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.647,73	100,00%

		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	%
	Gesamtleist	4.795,00	1.918,00	6.712,00	14.384,00	19.178,00	19.354,08	26.849,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.025,08	100,00%
-	Herstellkosten	3.112,75	1.597,26	5.567,39	10.417,24	15.591,04	14.201,50	20.393,89	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.485,08	75,74%
=	Rohergebnis	1.682,25	320,74	1.144,61	3.966,76	3.586,96	5.152,58	6.455,11	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	24,26%
-	Verw.-kosten	2.322,15	3.358,14	2.392,84	1.735,53	2.441,99	1.849,47	4.432,75	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,65	19,75%
=	Nettoergebni	-639,90	-3.037,40	-1.248,23	2.231,22	1.144,96	3.303,11	2.022,35	601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,35	4,51%

Wirtschaftlichkeit der Baustelle:
104,72%

Umsatzrentabilität der Baustelle
4,51%

Gesamtleistung
 97.025,08

durch


Selbstkosten
 92.647,73

Nettoergebnis
 4.377,35

durch

Gesamtleistung
 97.025,08

Kostenstruktur der Herstellkosten

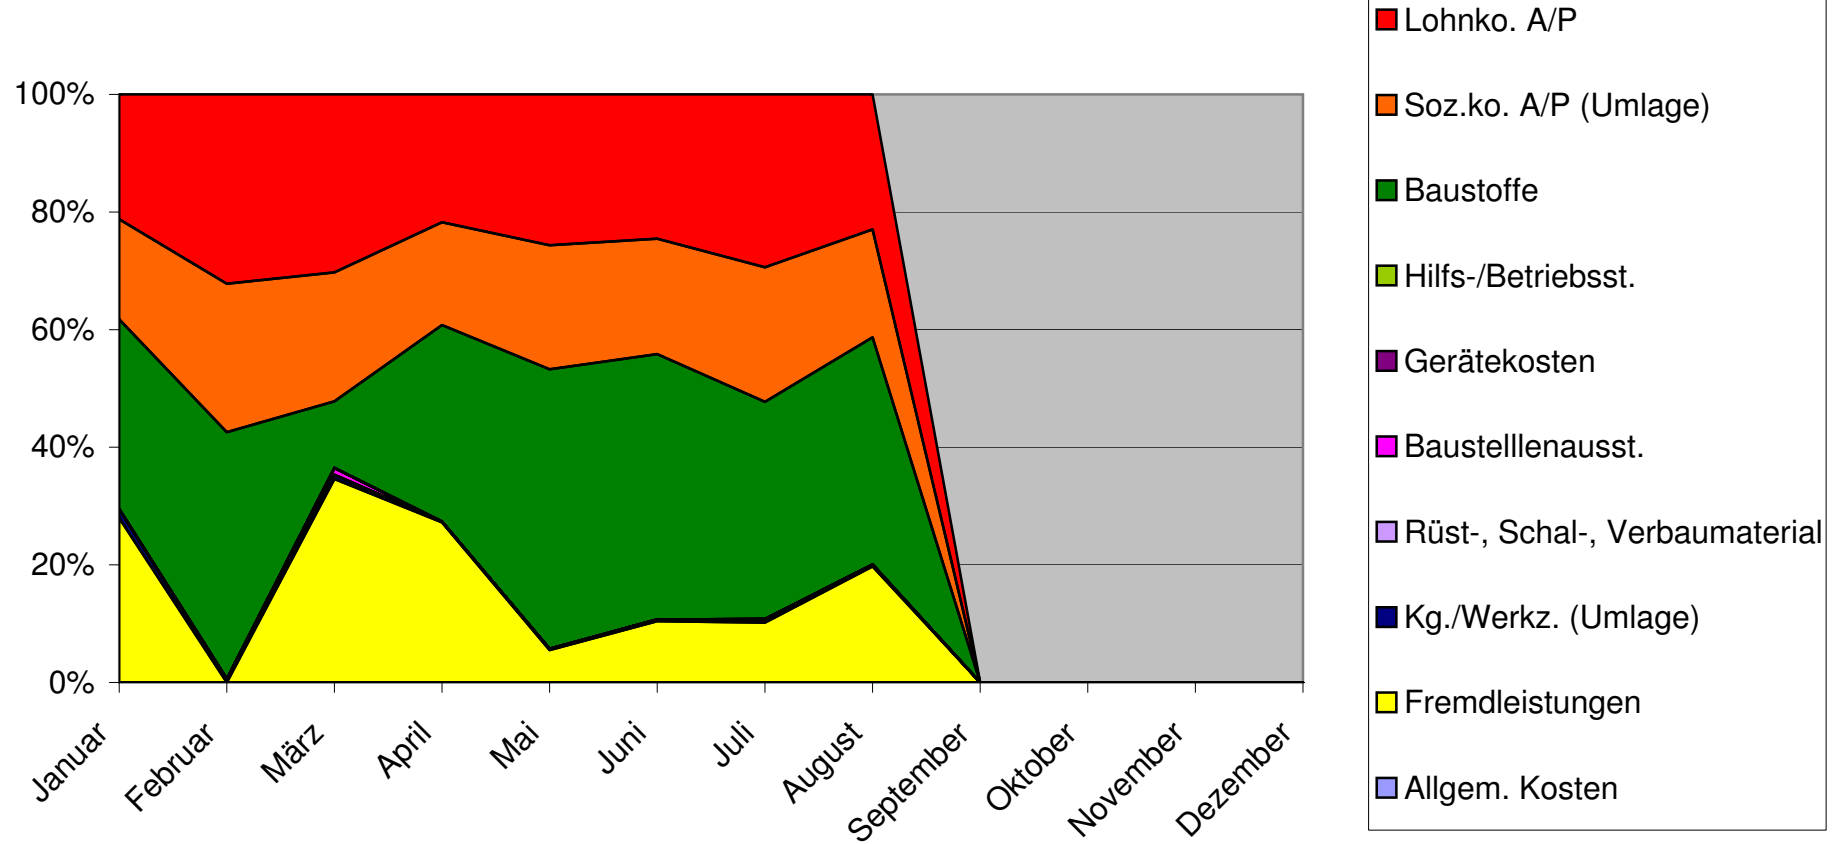

Deckungsbeitragsbetrachtung Baustelle - Ist 2006

Baustelle: Hetze: Neubau Eigenheim
 Baubeginn: 09.01.06
 Bauende: 28.08.06

KoSt-Nr.: 9501
 Projekt-Nr.: PRO5/125
 Bauleistung: 97.025,1 €

	Gesamt	fix	variabel	% variabel
Ist-Leistung	97.025,08			
Baustoffe	28.142,68	0,00	28.142,68	100,00%
Personalkosten	34.395,58	0,00	34.395,58	100,00%
Fremdleistungen	10.562,97	0,00	10.562,97	100,00%
übrige Herstellkosten	383,85	0,00	383,85	100,00%
Summe HK	73.485,08	0,00	73.485,08	
AGK	19162,65	19162,65	0,00	0,00%
Summe AGK	19.162,65	19.162,65	0,00	
Summe Kosten	92.647,73	19.162,65	73.485,08	
Gewinn	4.377,35			
Deckungsbeitrag	23.540,00			
DB in %	24,26%			
Leistungsstd. pro Jahr	1960,00			
DB pro Stunde	12,01			

Leistungsmeldung

Baust.: Hetze: Neubau Eigenheim
Monat: April

KoSt-Nr.: 9501
Projekt-Nr.: PRO5/125

	Monat	Jahresbeginn bis Vormonat	Jahresbeginn bis Stichtag
1. Erbrachte Bauleistungen			
1.1 Bauleistungen lt. LV	14.384,00	13.425,00	27.809,00
1.2. Nachtragsarbeiten	0,00	0,00	0,00
1.3. Stundenlohnarbeiten	0,00	0,00	0,00
1.4. Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
1.5. Sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Σ	14.384,00	13.425,00	27.809,00
2. Leistungsberichtigungen			
2.1 Erhöhungen			
2.1.1 bei Preisgleitklauseln	0,00	0,00	0,00
2.2 Minderungen			
2.2.1 Preisnachlässe	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Rückstellg. für Baust.räumung	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Rechnungsabstriche	0,00	0,00	0,00
2.2.4. Materialstellung durch Auftraggeber	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	Σ 14.384,00	13.425,00	27.809,00
4. Davon abgerechnet	15.932,49	15.552,00	31.484,49
5. Davon nicht abgerechnet	-1.548,49	-2.127,00	-3.675,49

Gestellte Rechnungen

Baust.: Hetze: Neubau Eigenheim
Monat: April

KoSt-Nr.: 9501
Projekt-Nr.: PRO5/125

Beleg	Datum	Betrag	Korrektur	Rest
RE 5/054	17.1.08	1.552,00	0,00	1.552,00
RE 6/010	23.1.08	14.000,00	0,00	14.000,00
RE 6/012	10.4.08	15.932,00	0,00	15.932,49
Summe		31.484,00	0,00	31.484,49

Kostenstellenblatt

Baustelle: Hetze: Neubau Eigenheim
Monat: April

KoSt-Nr.: 9501
Projekt-Nr.: PRO5/125

Ko.arten- gruppe	Monat	Jahresbeginn bis Vormonat	Jahresbeginn bis Stichtag
01 Löhne & Gehälter A/P	2.263,83	2.860,60	5.124,43
02 Sozialkosten A/P (Umlage)	1.823,07	2.153,18	4.026,35
03 Lohnnebenkosten A/P	0,00	0,00	0,00
04 Baustoffe	3.480,00	2.305,50	5.785,50
05 Hilfs- und Betriebsstoffkosten	0,00	0,00	0,00
06 Gerätekosten	0,00	0,00	0,00
07 Baustellenausstattung	0,00	65,00	65,00
08 Rüst-, Schal-, Verbaumaterial	0,00	0,00	0,00
09 Kleingeräte/Werkzeuge (Umlage)	14,34	96,15	84,51
10 Fremdleistungen	2.836,00	2.796,97	5.632,97
11 Allgemeine Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	10.417,24	10.277,40	20.718,76
Abgrenzungen			
20 Bestände	0,00	0,00	0,00
21 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Herstellkosten	10.417,24	10.277,40	20.718,76
Verwaltungskosten (anteil. Umlage)	1.735,53	8.073,13	8.305,84
Selbstkosten	12.152,78	18.350,53	29.024,60
Gesamtleistung	14.384,00	13.425,00	27.809,00
Ergebnis	2.231,22	-4.925,53	-2.694,31

$$\text{Umlage Verwaltungskosten: } \frac{\text{Verwaltungskosten}}{\text{Herstellkosten}} * 100 \quad \text{Umlage der Schlüsselkosten: } \frac{\text{Sozialkosten}^{A/P}}{\text{Löhne}^{A/P}} * 100$$

$$\frac{\text{Kleingeräte / Werkzeuge}}{\text{Löhne}^{A/P}} * 100$$

Verwaltungskosten Monat:	2.811,09	Umlage Verwaltungskosten Monat:	16,66%
Sozialkosten Betrieb Monat:	3882,88	Umlage Sozialkosten Monat:	80,53%
Kleingeräte/Werkz. Betrieb Monat:	30,54	Umlage Kleinger./Werkzeuge Monat:	0,63%
Herstellkosten Betrieb Monat:	16.873,07		
Löhne Betrieb Monat:	4.821,63		

Verwaltungskosten Stichtag:	10.884,22	Umlage Verwaltungskosten Stichtag:	40,09%
Sozialkosten Betrieb Stichtag:	6.036,06	Umlage Sozialkosten Stichtag:	78,57%
Kleingeräte/Werkz. Betrieb Stichtag:	126,69	Umlage Kleinger./Werkzeuge Stichtag:	1,65%
Herstellkosten Betrieb Stichtag:	27.150,47		
Löhne Betrieb Stichtag:	7.682,23		

Monatswerte Einzelbaustelle

Baustelle: #WERT!
Baubeginn: #WERT!
Bauende: #WERT!


KoSt-Nr.: #WERT!
Projekt-Nr.: #WERT!
Bauleistung: 0,0 €

lfd.-Nr.: 0

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dekember
Bauleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Erhöhungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Minderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Herstellkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
ant. Verw.kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Selbstkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zur Übernahme der Stammdaten aus dem Tabellenblatt "Jahreswerte Baustellen" (Arbeitsmappe BAB) hier bitte die neue laufende Nummer der Baustelle eingeben und Datei unter Projektbezeichnung speichern.


Zur Übernahme der Stammdaten aus dem Tabellenblatt "Jahreswerte Baustellen" (Arbeitsmappe BAB) hier bitte die neue laufende Nummer der Baustelle eingeben und Datei unter Projektbezeichnung speichern.

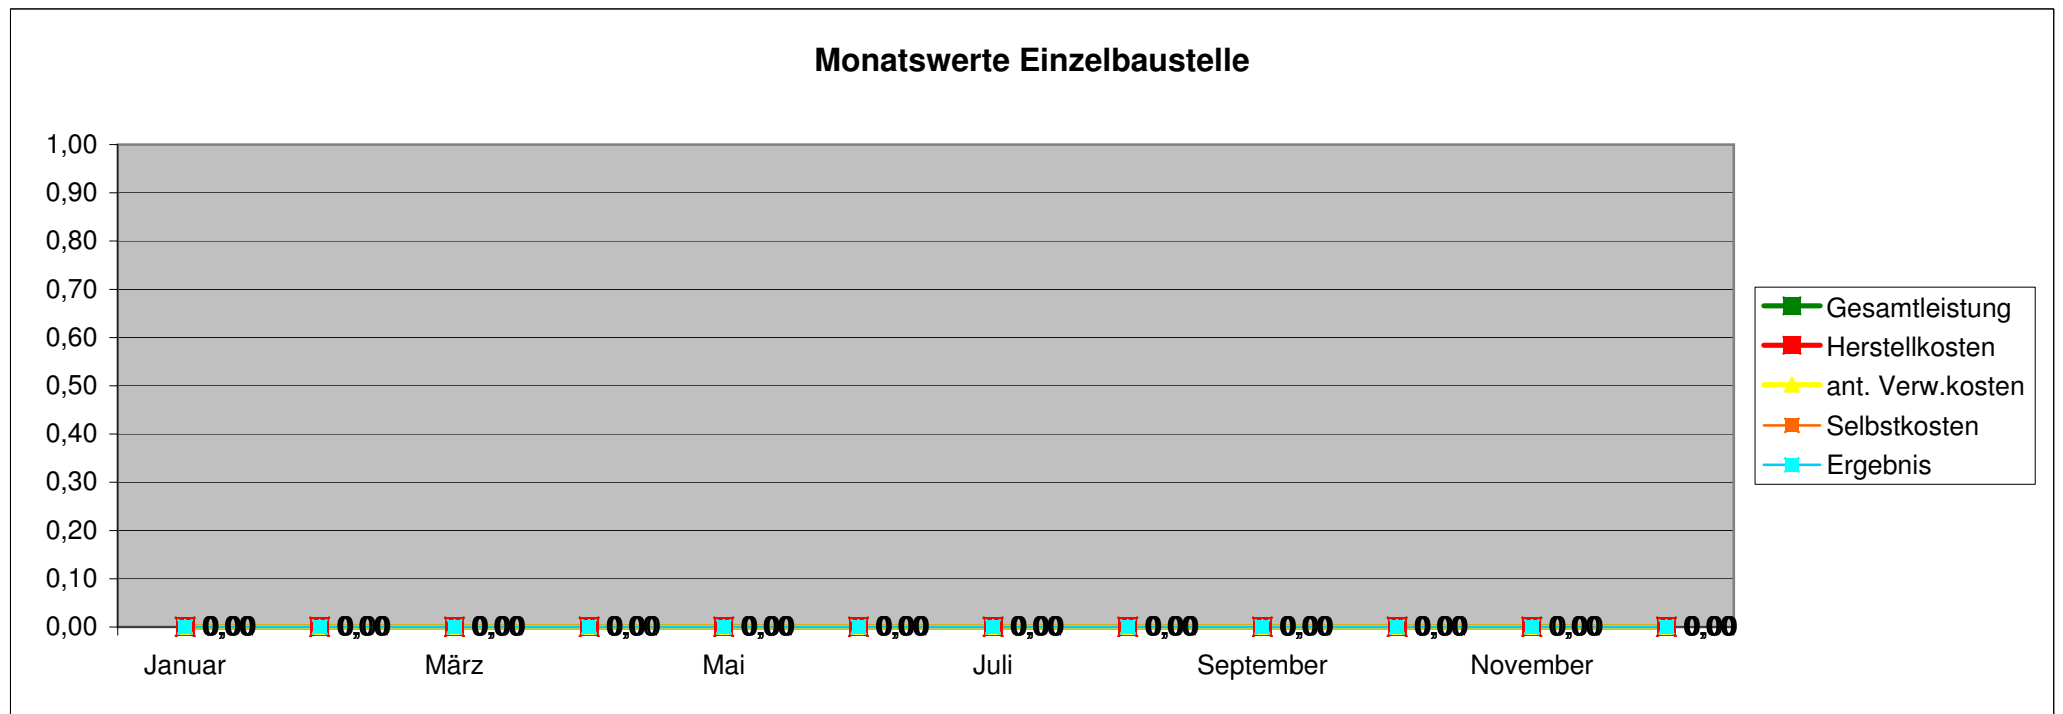

Jahresübersicht Betrieb (Einzelwerte)

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bauleistung	4.988,20	1.918,00	6.712,00	24.854,31	31.122,08	39.906,78	31.825,58	20.552,39	22.148,57	19.842,20	18.446,66	21.795,26
Erhöhungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minderungen	193,20	0,00	0,00	111,28	0,00	14,39	219,31	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	4.795,00	1.918,00	6.712,00	24.743,03	31.122,08	39.892,39	31.606,27	20.552,39	22.049,63	19.842,20	18.446,66	21.789,87
Herstellkosten	3.112,75	1.597,26	5.567,39	16.873,07	26.761,77	30.056,22	23.840,33	15.420,60	14.064,25	12.789,00	11.881,87	14.879,58
ges. Verw.kosten	2.322,15	3.358,14	2.392,84	2.811,09	4.191,64	3.914,23	5.181,86	3.729,48	4.064,31	4.779,96	3.882,84	6.464,34
Selbstkosten	5.434,90	4.955,40	7.960,23	19.684,16	30.953,41	33.970,45	29.022,19	19.150,08	18.128,56	17.568,96	15.764,71	21.343,92
Ergebnis	-639,90	-3.037,40	-1.248,23	5.058,87	168,67	5.921,94	2.584,08	1.402,31	3.921,07	2.273,24	2.681,95	445,95

Monatswerte Betrieb

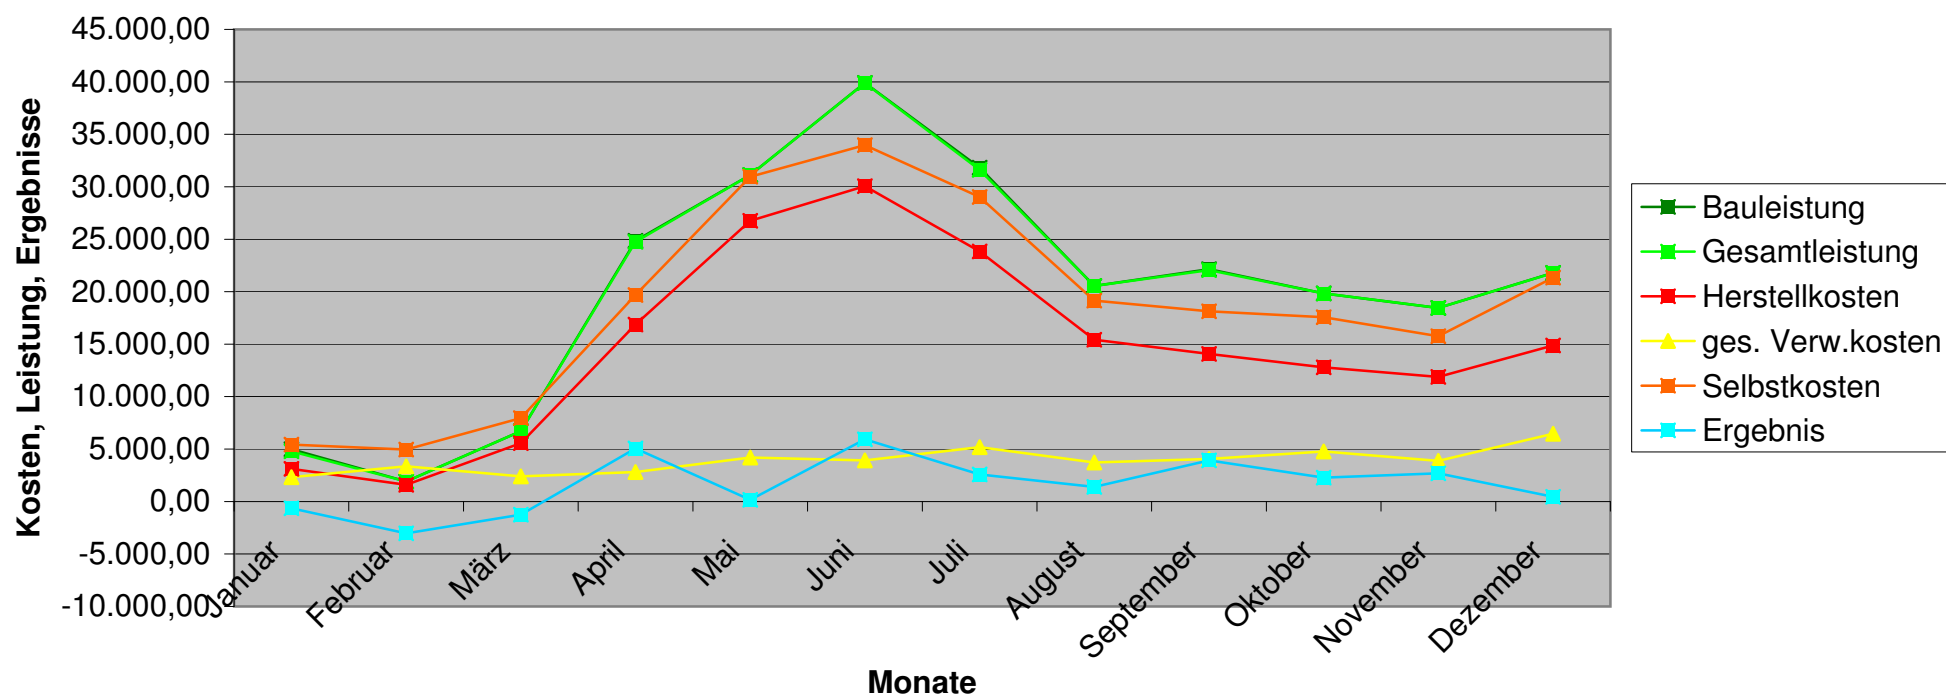

Erfolgsstruktur Gesamtbetrieb Monatswerte

	Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	%
01	Lohnko. A/P	661,00	514,00	1.685,60	4.821,63	6.895,77	8.050,70	7.026,60	3.435,88	3.900,40	4.194,04	3.900,40	4.682,58	49.768,60	22,22%
02	Soz.ko. A/P (U	529,20	403,34	1.220,64	3.882,88	5.667,76	6.440,00	5.463,12	2.748,47	2.830,38	3.355,24	3.078,37	3.508,25	39.127,65	17,47%
03	LNK A/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04	Baustoffe	1.005,30	670,20	630,00	5.302,02	9.582,35	12.870,66	9.129,18	8.333,79	6.550,79	5.104,54	4.664,53	6.415,65	70.259,01	31,37%
05	Hilfs-/Betriebsst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06	Gerätekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	0,06%
07	Baustellenauss	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	66,43	251,43	0,11%
08	Rüst-, Schal-, V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	Kg./Werkz. (Um	47,25	9,72	39,18	30,54	54,49	101,50	145,43	50,00	113,42	75,18	178,57	206,67	1.051,95	0,47%
10	Fremdleistunge	870,00	0,00	1.926,97	2.836,00	4.561,40	2.593,36	2.076,00	852,46	532,00	0,00	0,00	0,00	16.248,19	7,26%
11	Allgem. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	Bestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
=	Herstellkosten	3.112,75	1.597,26	5.567,39	16.873,07	26.761,77	30.056,22	23.840,33	15.420,60	14.064,25	12.789,00	11.881,87	14.879,58	176.844,09	78,97%
+	Verw.ko (Umlag	2.322,15	3.358,14	2.392,84	2.811,09	4.191,64	3.914,23	5.181,86	3.729,48	4.064,31	4.779,96	3.882,84	6.464,34	47.092,88	21,03%
=	Selbstkosten	5.434,90	4.955,40	7.960,23	19.684,16	30.953,41	33.970,45	29.022,19	19.150,08	18.128,56	17.568,96	15.764,71	21.343,92	223.936,97	100,00%

		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	%
	Gesamtleistung	4.795,00	1.918,00	6.712,00	24.743,03	31.122,08	39.892,39	31.606,27	20.552,39	22.049,63	19.842,20	18.446,66	21.789,87	243.469,52	100,00%
-	Herstellkosten	3.112,75	1.597,26	5.567,39	16.873,07	26.761,77	30.056,22	23.840,33	15.420,60	14.064,25	12.789,00	11.881,87	14.879,58	176.844,09	72,64%
=	Rohergebnis	1.682,25	320,74	1.144,61	7.869,96	4.360,31	9.836,17	7.765,94	5.131,79	7.985,38	7.053,20	6.564,79	6.910,29	66.625,43	27,36%
-	Verw.-kosten	2.322,15	3.358,14	2.392,84	2.811,09	4.191,64	3.914,23	5.181,86	3.729,48	4.064,31	4.779,96	3.882,84	6.464,34	47.092,88	19,34%
=	Nettoergebnis	-639,90	-3.037,40	-1.248,23	5.058,87	168,67	5.921,94	2.584,08	1.402,31	3.921,07	2.273,24	2.681,95	445,95	19.532,55	8,02%

Wirtschaftlichkeit des Betriebes:

108,72%

Umsatzrentabilität des Betriebes

8,02%

Gesamtleistung

243.469,52

durch

Selbstkosten

223.936,97

Nettoergebnis

19.532,55

durch

Gesamtleistung

243.469,52

Deckungsbeitragsbetrachtung Gesamtbetrieb - Ist 2006

	Gesamt	fix	variabel	% variabel
IST-Leistung	243.469,52			
Baustoffe	70.259,01	0,00	70.259,01	100,00%
Personalkosten	88.896,25	0,00	88.896,25	100,00%
Fremdleistungen	16.248,19	0,00	16.248,19	100,00%
übrige Herstellkosten	1.440,64	0,00	1.440,64	100,00%
Summe Herstellk.	176.844,09	0,00	176.844,09	
Kfz-Kosten	7.717,38	7.717,38	0,00	0,00%
Bezugskosten AGK	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00%
DL, Versicherungen	5.835,24	5.835,24	0,00	0,00%
Grundst. und Gebäude	2.203,55	2.203,55	0,00	0,00%
Instandh., Reparaturen	2.558,49	2.558,49	0,00	0,00%
sonstige AGKs	3.928,22	3.928,22	0,00	0,00%
Summe AGK	47.092,88	47.092,88	0,00	
Gesamtkosten	223.936,97	47.092,88	353.688,18	
Gewinn	19.532,55			
Deckungsbeitrag	66.625,43			
DB in %	27,36%			
Leistungsstd. pro Jahr	5078,00			
DB pro Stunde	13,12			

Betriebsabrechnungsbogen Bauunternehmen Kupka Ltd. & Co. KG*

Jahr: 2006

Kostenstelle		Jahresübersicht Baustellen 2006									Wirtschaftlichkeit		Umsatzrentabilität	
		Leistungen				- Kosten			= Ergebnis					
		Bauleistungen	+ Erhöhungen	- Minderungen	= Gesamtleistung	Herstellkosten	= Verwaltungskosten	+ Selbstkosten	Bruttoergebnis	Nettoergebnis				
Bst Nr.														
1	Baustelle 9500 TLG	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
2	Baustelle 9501 Hetze	97.025,08	0,00	0,00	97.025,08	73.485,08	19.162,65	92.647,73	23.540,00	4.377,35	104,72%	4,51%		
3	Baustelle 9502 TLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
4	Baustelle 9503 WGW	3.709,51	0,00	111,28	3.598,23	2.386,68	397,63	2.784,31	1.211,55	813,92	129,23%	22,62%		
5	Baustelle 9504 Rietz	22.536,00	0,00	0,00	22.536,00	18.692,45	2.877,21	21.569,66	3.843,55	966,34	104,48%	4,29%		
6	Baustelle 9505 Zschaubit	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65	1.285,20	167,37	1.452,57	535,45	368,08	125,34%	20,22%		
7	Baustelle 9506 Thiele/Schaa	9.206,37	0,00	0,00	9.206,37	7.189,62	936,31	8.125,92	2.016,75	1.080,45	113,30%	11,74%		
8	Baustelle 9507 WGW	2.660,77	0,00	79,82	2.580,95	1.715,68	223,43	1.939,11	865,27	641,84	133,10%	24,87%		
9	Baustelle 9508 WGW	479,64	0,00	14,39	465,25	339,87	44,26	384,13	125,38	81,12	121,12%	17,44%		
10	Baustelle 9509 Schaale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
11	Baustelle 9510 Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
12	Baustelle 9511 Scherf	2.554,15	0,00	51,08	2.503,07	1.871,78	243,76	2.115,54	631,29	387,53	118,32%	15,48%		
13	Baustelle 9512 Anton	3.558,33	0,00	88,41	3.469,92	2.335,57	507,65	2.843,22	1.134,35	626,70	122,04%	18,06%		
14	Baustelle 9513 TLG	614,32	0,00	0,00	614,32	552,60	120,11	672,71	61,72	-58,39	91,32%	-9,51%		
15	Baustelle 9514 Lehne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
16	Baustelle 9515 Eger	2.009,82	0,00	0,00	2.009,82	1.409,21	327,14	1.736,36	600,61	273,46	115,75%	13,61%		
17	Baustelle 9516 Felix	1.836,77	0,00	0,00	1.836,77	1.771,05	428,33	2.199,38	65,72	-362,61	83,51%	-19,74%		
18	Baustelle 9517 Kodantke	4.318,41	0,00	0,00	4.318,41	3.321,48	803,30	4.124,79	996,93	193,62	104,69%	4,48%		
19	Baustelle 9518 Reichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
20	Baustelle 9519 Miltank	8.646,76	0,00	0,00	8.646,76	6.393,01	1.546,15	7.939,17	2.253,75	707,59	108,91%	8,18%		
21	Baustelle 9520 Felix	718,38	0,00	0,00	718,38	511,97	147,95	659,92	206,41	58,46	108,86%	8,14%		
22	Baustelle 9521 Neubauer	709,56	0,00	0,00	709,56	480,11	116,12	596,23	229,45	113,33	119,01%	15,97%		
23	Baustelle 9522 Gefha	3.498,28	0,00	0,00	3.498,28	2.183,35	630,95	2.814,29	1.314,93	683,99	124,30%	19,55%		
24	Baustelle 9523 Berger	4.947,12	0,00	98,94	4.848,18	3.112,26	899,39	4.011,65	1.735,92	836,53	120,85%	17,25%		
25	Baustelle 9524 Albus	44.425,37	0,00	0,00	44.425,37	29.420,99	10.301,60	39.722,59	15.004,38	4.702,78	111,84%	10,59%		
26	Baustelle 9525 TLG	565,82	0,00	0,00	565,82	223,03	83,36	306,39	342,79	259,43	184,67%	45,85%		
27	Baustelle 9526 Gefha	3.114,80	0,00	0,00	3.114,80	2.069,39	773,44	2.842,83	1.045,41	271,97	109,57%	8,73%		
28	Baustelle 9527 Grüger	1.076,22	0,00	0,00	1.076,22	652,31	243,81	896,12	423,91	180,10	120,10%	16,73%		
29	Baustelle 9528 Hempel	4.198,51	0,00	0,00	4.198,51	2.744,15	914,22	3.658,37	1.454,36	540,14	114,76%	12,87%		
30	Baustelle 9529 Schreiber	6.236,19	0,00	0,00	6.236,19	3.680,74	1.308,69	4.989,43	2.555,45	1.246,76	124,99%	19,99%		
31	Baustelle 9530 Gefha	326,35	0,00	0,00	326,35	224,53	83,92	308,45	101,82	17,90	105,80%	5,49%		
32	Baustelle 9531 Gefha	317,28	0,00	0,00	317,28	143,87	47,01	190,88	173,41	126,40	166,22%	39,84%		
33	Baustelle 9532 Stadt Wurzer	909,40	0,00	0,00	904,01	620,37	269,52	889,89	283,64	14,12	101,59%	1,56%		
34	Baustelle 9533 Gefha	2.827,75	0,00	0,00	2.827,75	1.727,12	750,34	2.477,45	1.100,63	350,30	114,14%	12,39%		
35	Baustelle 9534 Ulbricht	6.690,94	0,00	0,00	6.690,94	4.633,73	2.013,10	6.646,83	2.057,21	44,11	100,66%	0,66%		
36	Baustelle 9535 Kanitz	2.380,28	0,00	0,00	2.380,28	1.666,89	724,17	2.391,07	713,39	-10,79	99,55%	-0,45%		
Kostenstellen gesamt		244.112,03	0,00	637,12	243.469,52	176.844,09	47.092,88	223.936,97	66.625,43	19.532,55	108,72%	8,02%		

*alle Angaben in Euro

Monatlicher Betriebsabrechnungsbogen Bauunternehmen Kupka Ltd. & Co. KG*
Monat:

Juli

Jahr:

2006

Bst Nr.	Kostenstelle	Monat					Jahresbeginn bis Stichtag		
		Gesamtleistung	- Herstellkosten	= Rohergebnis	- ant. Verw.ko.	= Nettoergebnis	Gesamtleistung	- Herstellkosten	= Rohergebnis
1	Baustelle 9500 TLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Baustelle 9501 Hetze	26.849,00	20.393,89	6.455,11	4.432,75	2.022,35	93.190,08	70.881,08	22.309,00
3	Baustelle 9502 TLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Baustelle 9503 GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,23	2.386,68	1.211,55
5	Baustelle 9504 Rietz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,00	18.692,45	3.843,55
6	Baustelle 9505 Zschaubitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,65	1.285,20	535,45
7	Baustelle 9506 Thiele/Schaale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,37	7.189,62	2.016,75
8	Baustelle 9507 GWG	-79,82	0,00	-79,82	0,00	-79,82	2.580,95	1.715,68	865,27
9	Baustelle 9508 GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25	339,87	125,38
10	Baustelle 9509 Schaale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Baustelle 9510 Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Baustelle 9511 Scherf	-51,08	0,00	-51,08	0,00	-51,08	2.503,07	1.871,78	631,29
13	Baustelle 9512 Anton	3.469,92	2.335,57	1.134,35	507,65	626,70	3.469,92	2.335,57	1.134,35
14	Baustelle 9513 TLG	614,32	552,60	61,72	120,11	-58,39	614,32	552,60	61,72
15	Baustelle 9514 Lehne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Baustelle 9515 Eger	803,93	558,27	245,66	121,34	124,32	803,93	558,27	245,66
17	Baustelle 9516 Felix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Baustelle 9517 Kodantke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Baustelle 9518 Reichert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Baustelle 9519 Mitdank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Baustelle 9520 Felix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Baustelle 9521 Neubauer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Baustelle 9522 Gefha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Baustelle 9523 Berger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baustelle 9524 Albus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baustelle 9525 TLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Baustelle 9526 Gefha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Baustelle 9527 Grüger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Baustelle 9528 Hempel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Baustelle 9529 Schreiber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Baustelle 9530 Gefha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Baustelle 9531 Gefha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Baustelle 9532 Stadt Wurzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Baustelle 9533 Gefha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Baustelle 9534 Ulbricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Baustelle 9535 Kanitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baustellen gesamt		31.606,27	23.840,33	7.765,94		2.584,08	140.788,77	107.808,79	32.979,98
Verwaltung 9400				-5.181,86	5.181,86	x	0,00		-24.171,95
Betriebsergebnis				2.584,08		2.584,08			8.808,03

Übersicht Jahreswerte Baustellen 2006

lfd-Nr.	Baustelle Bauherr	Baustelle Bezeichnung	Hilfswert Verkettung	Projekt-Nr.	KoSt.-Nr.	Baubeginn	Bauende	Bauleistung	Erhöhungen	Min- derungen	Gesamt- leistung	Herstell- kosten	ant. Verw. Kosten	Selbst-kosten	Ergebnis
Index								1	2	3	4	5	6	7	8
1	TLG	Erdarbeiten Wasseranschluß	arbeiten Wasse	PRO5/124	9500	23.12.05	23.12.05	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hetze	Neubau Eigenheim	: Neubau Eige	PRO5/125	9501	09.01.06	28.08.06	97.025,08	0,00	0,00	97.025,08	73.477,86	38.891,00	93.044,72	4.377,35
3	TLG	entfallen	TLG: entfallen	PRO6/137	9502		30.03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WGW	Th.-Körner-Str. 6, Mauern und Purner-Str. 6, Ma		PRO5/123	9503	03.04.06	10.04.06	3.709,51	0,00	111,28	3.598,23	2.382,41	630,39	3.012,80	813,92
5	Rietz	Fassade, Umbau WH und Garage, Umbau WH		PRO5/015	9504	18.04.06	14.06.06	22.536,00	0,00	0,00	22.536,00	18.615,84	4.957,32	23.573,16	966,34
6	Zschaubit	Eingangstreppe, Podesterneuerungstreppe, P		PRO6/133	9505	26.06.06	29.06.06	1.820,65	0,00	0,00	1.820,65	1.285,20	342,24	1.627,44	368,08
7	Thiele/Schaale	Edelputz	ä/Schaale: Ed	PRO5/118	9506	06.06.06	23.06.06	9.206,37	0,00	0,00	9.206,37	7.178,46	1.899,42	9.077,88	1.080,45
8	WGW	Abbruch	-Bebel-Str. Pl	PRO6/152	9507	26.05.06	30.06.06	2.660,77	0,00	79,82	2.580,95	1.712,51	453,13	2.165,64	641,84
9	WGW	Kleinreparaturen Bgm.-Schm. Plaparaturen Bgm		PRO6/159	9508	09.06.06	09.06.06	479,64	0,00	14,39	465,25	339,41	89,81	429,21	81,12
10	Schaale	zusammengefaßt zu 9506 (Thielengefaßt zu 950		PRO6/146	9509	06.06.06	23.06.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bima	entfallen	Bima: entfallen	PRO6/145	9510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Scherf	Taucha, Fassadenüberarbeitung	ha, Fassaden	PRO6/136	9511	26.06.06	30.06.06	2.554,15	0,00	51,08	2.503,07	1.867,49	494,14	2.361,63	387,53
13	Anton	Wohnhaus	; Algenentfern	PRO6/132	9512	17.07.06	21.07.06	3.558,33	0,00	88,41	3.469,92	2.343,09	619,98	2.963,07	626,70
14	TLG	Wurzen, Schlitzeinlauf Gebäude 7, Schlitzeinlauf		PRO6/160	9513		27.07.06	614,32	0,00	0,00	614,32	553,41	146,43	699,84	-58,39
15	Lehne	Dehnitz, Putzarbeiten Stützmauertz, Putzarbeite		PRO6/150	9514		02.08.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Eger	Körlitz, Hofpflaster	: Körlitz, Hofpfl	PRO6/143	9515	30.07.06	03.08.06	2.009,82	0,00	0,00	2.009,82	1.408,98	372,82	1.781,80	273,46
17	Felix	Wurzen Fenstererneuerung, Asphenstererneueru		PRO6/139	9516	21.08.06	24.08.06	1.836,77	0,00	0,00	1.836,77	1.769,65	468,25	2.237,89	-362,61
18	Kodantke	Brandis, Fassadenreparatur	randis, Fassad	PRO6/156	9517	16.08.06	23.08.06	4.318,41	0,00	0,00	4.318,41	3.315,59	877,30	4.192,90	193,62
19	Reichert	Sachsendorf, Mauerwerksausbes	ndorf, Mauerw	PRO6/153	9518			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mittdank	Streuben, Pflasterarbeiten + Troc	Pflasterarbeite	PRO6/134	9519	09.08.06	31.08.06	8.646,76	0,00	0,00	8.646,76	6.383,19	1.688,99	8.072,19	707,59
21	Felix	Innentüreneinbau	: Innentürenei	PRO6/173	9520	12.09.06	13.09.06	718,38	0,00	0,00	718,38	516,61	136,69	653,30	58,46
22	Neubauer	Arbeitnehmerüberlassung	Arbeitnehmerü	PRO6/176	9521	25.08.06	30.08.06	709,56	0,00	0,00	709,56	478,22	126,54	604,76	113,33
23	Gefha	Treppendemontage und -verschlundemontage u		PRO6/174	9522	10.09.06	18.09.06	718,38	0,00	0,00	718,38	516,61	136,69	653,30	58,46
24	Berger	Fassade Straßenseite	Fassade Straß	PROS/200	9523	16.09.06	21.09.06	4.947,12	0,00	98,94	4.848,18	3.160,70	836,32	3.997,02	836,53
25	Albus	Neubau EFH Engelsdorf	ebau EFH Er	PRO6/168	9524	01.09.06	31.12.06	44.425,37	0,00	0,00	44.425,37	29.455,24	7.793,84	37.249,08	4.702,78
26	TLG	Türeinbau Pforte/Materiallieferung	au Pforte/Mat	PRO6/180	9525	01.09.06	04.05.07	565,82	0,00	0,00	565,82	222,10	58,77	280,86	259,43
27	Gefha	Köhra, Fassadenausbesserung	Nsadenausbess	PRO6/181	9526	11.10.06	27.10.08	3.114,80	0,00	0,00	3.114,80	2.059,73	545,00	2.604,73	271,97
28	Grüger	Bennewitz, Mittelstr. 11, Nebentürlittelstr. 11, Ne		PRO6/175	9527	06.10.08	28.10.08	1.076,22	0,00	0,00	1.076,22	650,24	172,05	822,29	180,10
29	Hempel	Körlitz, Fassade und Hofpflaster	tz, Fassade ur	PRO6/177	9528	18.09.06	30.10.08	4.198,51	0,00	0,00	4.198,51	2.756,99	729,50	3.486,49	540,14
30	Schreiber	Zeititz, Fassadenerneuerung	Sturassadenerneu	PRO6/154	9529	20.11.06	23.12.06	6.236,19	0,00	0,00	6.236,19	3.659,20	968,22	4.627,42	1.246,76
31	Gefha	Wurzen, Jacobspl. 11, Schad.bes.bspl. 11, Sch		PRO6/179	9530	25.11.08	25.11.06	326,35	0,00	0,00	326,35	223,80	59,22	283,02	17,90
32	Gefha	Kleinarbeiten Dezember 2006	narbeiten Dezi	PRO6/190+91	9531	27.11.08	09.12.08	317,28	0,00	0,00	317,28	141,69	37,49	179,19	126,40
33	Stadt Wurzen	Reparatur Pfeiler und Einfriedung	atur Pfeiler un	PRO6/141	9532	23.11.08	30.11.08	909,40	0,00	0,00	904,01	623,80	165,06	788,85	14,12
34	Gefha	Wurzen, St. d. Friedens 11, Einb.Friedens 11, E		PRO6/185	9533		16.12.06	2.827,75	0,00	0,00	2.827,75	1.731,91	458,26	2.190,18	350,30
35	Ulbricht	Threna, Dorfstraße 40, Innenputz	ia, Dorfstraße	PRO6/189	9534	04.12.06	22.12.06	6.690,94	0,00	0,00	6.690,94	4.657,83	1.232,46	5.890,30	44,11
36	Kanitz	Großzscheпа, Treppensanierung	zscheпа, Trepp	PRO6/192	9535	15.12.06	23.12.06	2.380,28	0,00	0,00	2.380,28	1.671,55	442,29	2.113,84	-10,79
37															
38															
